

माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुतीकरण

दिनांक 19.09.2018

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पाँच जिला
अस्पतालों (फेज-1) को उच्चिकृत कर मेडिकल कालेजों
के निर्माण कार्य की प्रगति



कार्यदायी संस्था

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

अनुक्रमणिका

पेज सं०

विवरण

क्रम
सं०

1	शीर्षक पेज	01
2	अनुक्रमिका	02
3	फेज-1 के निर्माणाधीन पाँच मेडिकल कालेजों की प्रगति का विवरण (एल०ओ०पी० के अनुसार)	03
4	परियोजना का विस्तृत विवरण (क्षमता सहित)	04
5	प्रथम एल०ओ०पी० के सापेक्ष एम.सी.आई. के मानक के अनुरूप प्राथमिकता के भवन	05
6	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज फैजाबाद का पुस्तुतीकरण	06 से 13
7	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज बस्ती का पुस्तुतीकरण	14 से 22
8	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज फिरोजाबाद का पुस्तुतीकरण	23 से 30
9	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज शाहजहाँपुर का पुस्तुतीकरण	31 से 38
10	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज बहराईच का पुस्तुतीकरण	39 से 47
11	धन्यवाद	48

उत्तर प्रदेश के पाँच जनपदों में निर्माणाधीन राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों का विवरण

धनराशि ₹० करोड़ में

क्रम सं०	जनपद का नाम	परियोजना की स्वीकृत लागत			अद्यतन अवमुक्त की गयी धनराशि		अद्यतन व्यय की गयी धनराशि		कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति एल.ओ.पी. के सापेक्ष		
		कुल	भवन निर्माण	उपकरण	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश				राज्यांश	कुल
1	फैजाबाद	189.01	165.21	23.80	75.91	44.63	120.54	49.53	11.00	60.53	माच 2017	फरवरी 2019	80%
2	बस्ती	195.68	171.88	23.80	75.91	44.63	120.54	43.27	11.13	54.40	माच 2017	फरवरी 2019	76%
3	फिरोजाबाद	185.73	161.93	23.80	74.91	44.38	119.29	49.15	8.02	57.17	दिसम्बर 2016	फरवरी 2019	76%
4	शाहजहाँपुर	195.68	171.88	23.80	72.00	43.00	115.00	47.95	7.83	55.78	दिसम्बर 2016	फरवरी 2019	65%
5	बहराईच	189.16	171.08	18.08	65.81	40.27	106.08	49.91	5.69	55.60	अक्टूबर 2017	फरवरी 2019	65%
योग		955.26	841.98	113.28	364.54	216.91	581.45	201.61	43.67	245.28			

★ प्रथम एलओपीओ के सापेक्ष समस्त कार्य 31.10.2018 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

परियोजना का विस्तृत विवरण (क्षमता सहित)

कुर्सी क्षेत्रफल 52474 वर्गमीटर

1	एकेडमिक	→ प्रशासनिक भवन → एकेडमिक भवन → लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी एवं कैंपटीन भवन	610 सीट्स 500 शैय्या	(जिला अस्पताल की क्षमता को सम्मिलित करते हुए)
2	आडिटोरियम			
3	अस्पताल (आवश्यकतानुसार)			
4	ब्याजय हास्टल (दू सीटर)		250 छात्रों हेतु	
5	गर्ल्स हास्टल (दू सीटर)		126 छात्राओं हेतु	
6	इन्टर्न ब्याजय हास्टल (दू सीटर)		64 छात्रों हेतु	
7	इन्टर्न गर्ल्स हास्टल (दू सीटर)		36 छात्राओं हेतु	
8	रेजीडेन्ट हास्टल (जूनियर एवं सीनियर)		67 यूनिट	
9	नर्सिंग हास्टल		40 यूनिट	(जिला अस्पताल की क्षमता को सम्मिलित करते हुए)
10	आवास		कुल 59	
	(i) प्रधानाचार्य आवास (श्रेणी-VI)		1	
	(ii) श्रेणी-(V)		8	
	(iii) श्रेणी-(IV)		12	
	(iv) श्रेणी-(III)		22	
	(v) श्रेणी-(II)		16	

प्रथम एल0ओ0पी0 अनुसार दिनांक 31.10.2018 तक एम.सी.आई. की वांछनानुसार पाँच मेडिकल कालेजों को प्रारम्भ कराने हेतु प्राथमिकता के भवन

क्रम सं०	आवश्यक भवन का नाम	
1(अ)	प्रशासनिक भवन एवं सेन्ट्रल लाइब्रेरी	
(ब)	एकेडमिक ब्लॉक (एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्प्यूनिटी मेडिसिन, प्रैक्टिकल लेबोरेट्री 04 नं०)	
(स)	लेक्चर हॉल 120 क्षमता	02 नं०
2	नर्सिंग हास्टल	35 नं०
3	ब्यायज हास्टल	
4	गर्ल्स हास्टल	75 नं०
5	रेजीडेन्ट हास्टल	45 नं०
आवासीय भवन		
अ	शैक्षणिक आवास	
6	प्रधानाचार्य आवास	01 नं०
7	श्रेणी-5 के आवास	
8	श्रेणी-4 के आवास	12 नं०
ब	गैर शैक्षणिक आवास	
9	श्रेणी-3 के आवास	
10	श्रेणी-02 के आवास	20 नं०

राजकीय एलोपैथिक

मेडिकल कालेज


जनपद फैजाबाद

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज जनपद फैजाबाद

- कालेज फैजाबाद जनपद के गंजा गांव में निर्माणाधीन।
- कालेज परिसर फैजाबाद एअर स्ट्रिप के पीछे स्थित।
- कालेज परिसर की राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 28) से दूरी 04 किमी.।
- कालेज परिसर से रेफरल अस्पताल दर्शन नगर की दूरी 08 किमी.।
- रेफरल अस्पताल दर्शन नगर में कुल 300 शैया है।
- उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल : 17.42 एकड़।
- कालेज परिसर फैजाबाद सुल्तानपुर मार्ग से 02 किमी० कच्चा मार्ग पर निर्माणाधीन है एवं चिकित्सालय फैजाबाद अम्बेडकर नगर मार्ग पर (एन.एच. 28) से 02.50 किमी. दूरी पर स्थित है।
- मुख्य भवन 05 मंजिला।

निर्माणाधीन मेडिकल कालेज फैजाबाद के प्रथम एलओओपीओ हेतु

प्रगति विवरण

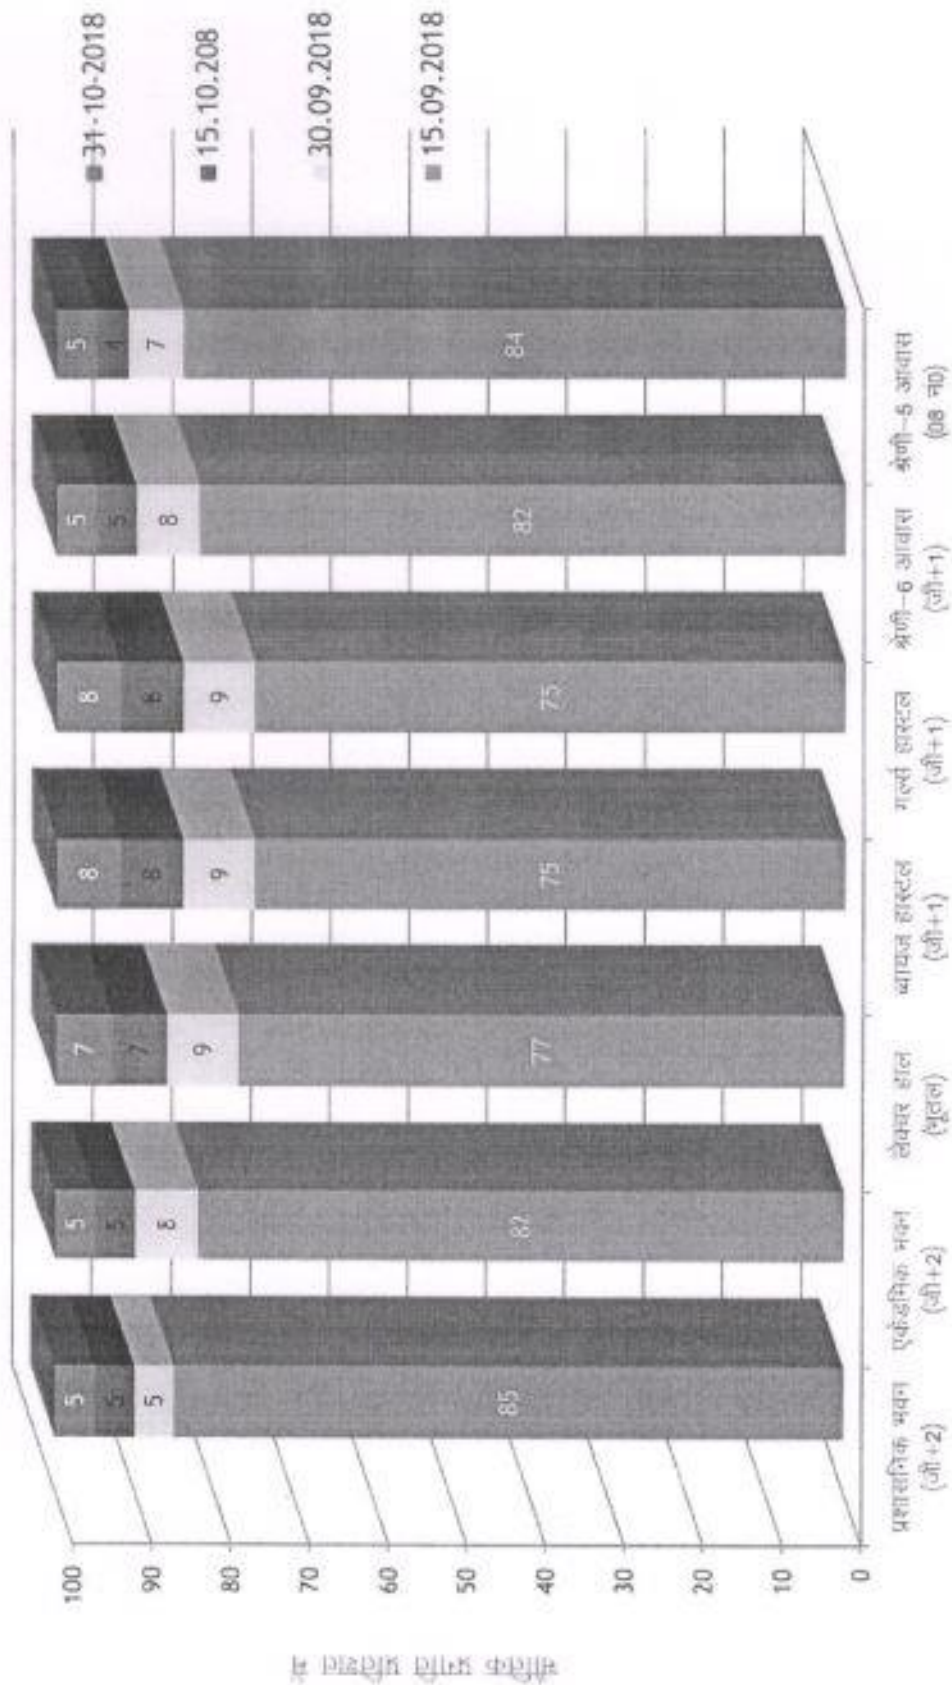


शैक्षिक प्रगति विवरण

प्रथम एलओपी0 के अनुसार निर्माणाधीन भवनों की भौतिक स्थिति

(बार चार्ट के अनुसार)

क्रम सं०	मेडिकल कालेज का नाम	दिनांक 15.08. 2018 तक का		दिनांक 31.08. 2018 तक का		दिनांक 15.09. 2018 तक का		दिनांक 30.09. 2018 तक का		दिनांक 15.10. 2018 तक का		दिनांक 31.10. 2018 तक का		समग्र भौतिक प्रगति दिनांक 15.09.2018 (प्रतिशत में)
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
मेडिकल कालेज फैजाबाद														
•	प्रशासनिक भवन (जी+2)	71	71	79	81	85	85	90	90	95	95	100	100	-
•	एकेडमिक भवन (जी+2)	69	69	78	78	84	82	90	90	95	95	100	100	-
•	लेक्चर हाल (भूतल)	61	61	71	71	79	77	86	86	93	93	100	100	-
•	ड्वायज हास्टल (जी+1)	55	55	68	69	76	75	84	84	92	92	100	100	-
•	गर्ल्स हास्टल (जी+1)	53	53	67	65	76	75	84	84	92	92	100	100	-
•	श्रेणी-6 आवास (जी+1)	74	74	79	79	85	82	90	90	95	95	100	100	-
•	श्रेणी-5 के आवास (08 नं०)	69	69	79	79	85	84	91	91	95	95	100	100	-
•	श्रेणी-3 के आवास (20 नं०)	59	59	70	70	78	75	85	85	93	93	100	100	-
80														


निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (फैजाबाद)

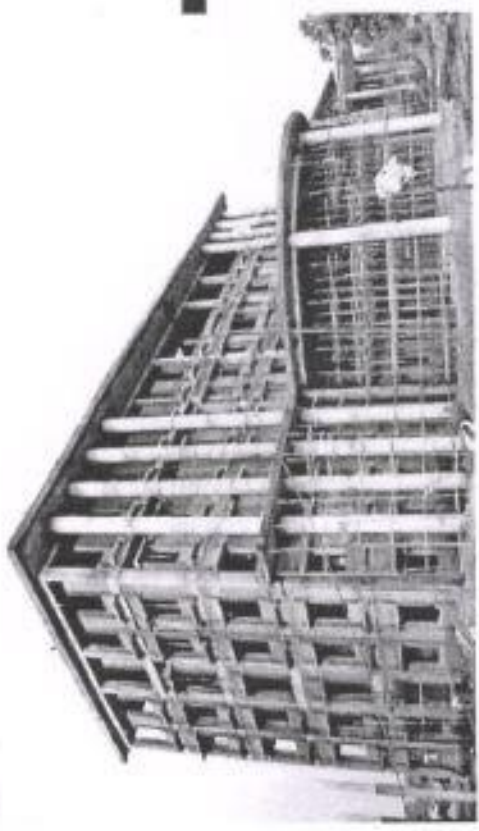

प्रशासनिक भवन 10.08.2018



प्रशासनिक भवन 15.09.2018

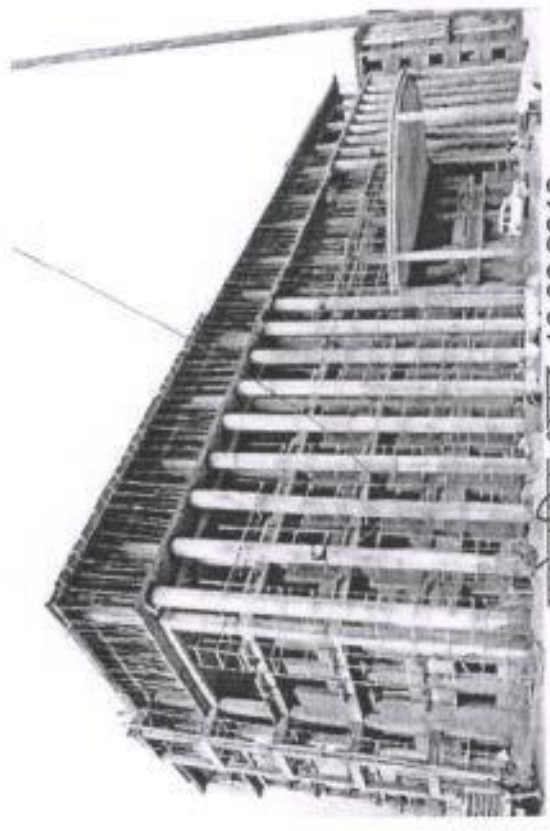


एकेडमिक भवन 10.08.2018



एकेडमिक भवन 15.09.2018


निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (फैजाबाद)

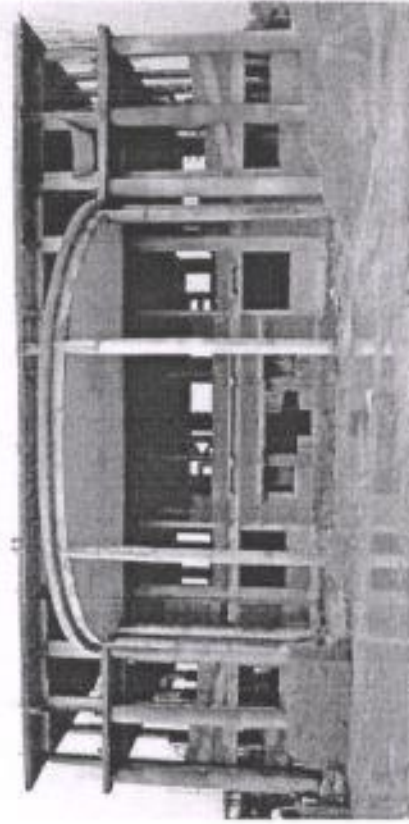


लेक्चर हाल दिनांक 10.08.2018



लेक्चर हाल दिनांक 15.09.2018

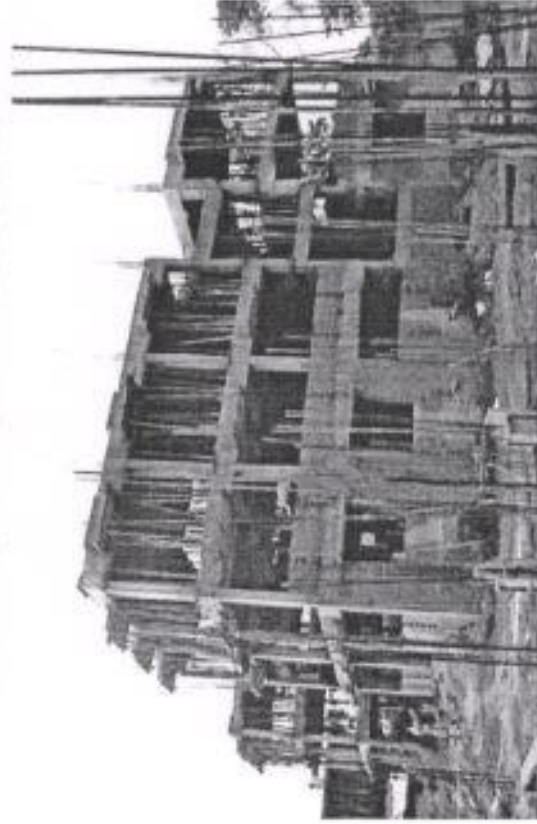


गर्ल्स हास्टल दिनांक 10.08.2018

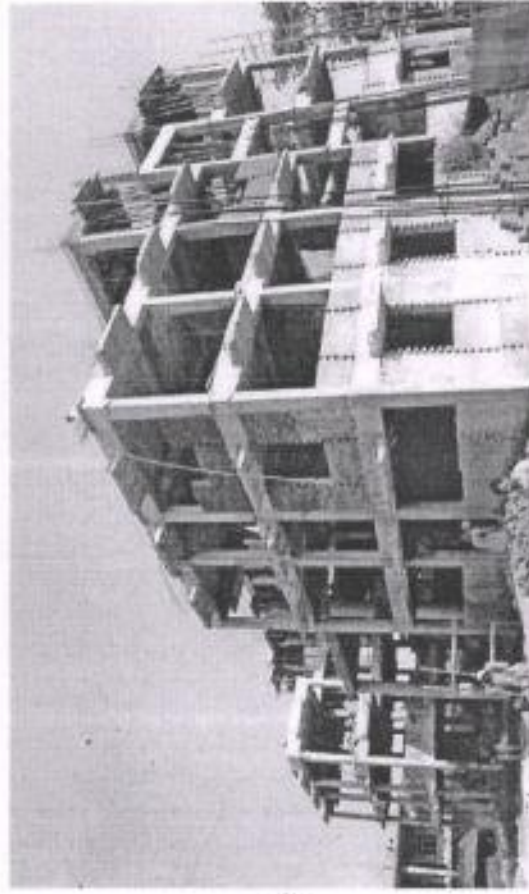

गर्ल्स हास्टल दिनांक 15.09.2018


निर्माणाधीन भवनो की भौतिक स्थिति (फैजाबाद)

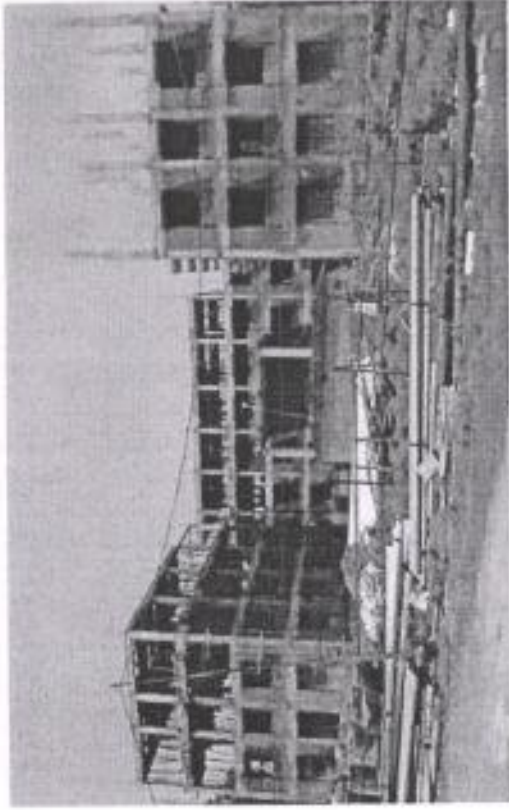


ब्वायज हास्टल दिनांक 10.08.2018



ब्वायज हास्टल दिनांक 15.09.2018

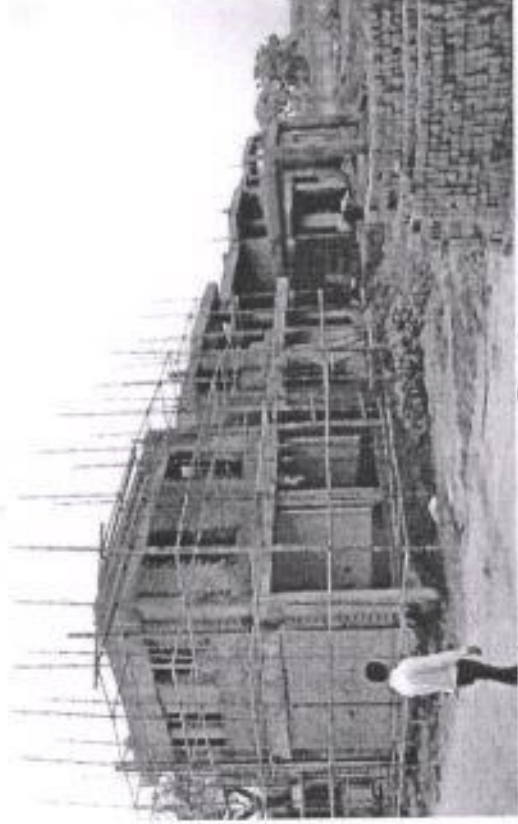

श्रेणी-5 आवास दिनांक 10.08.2018

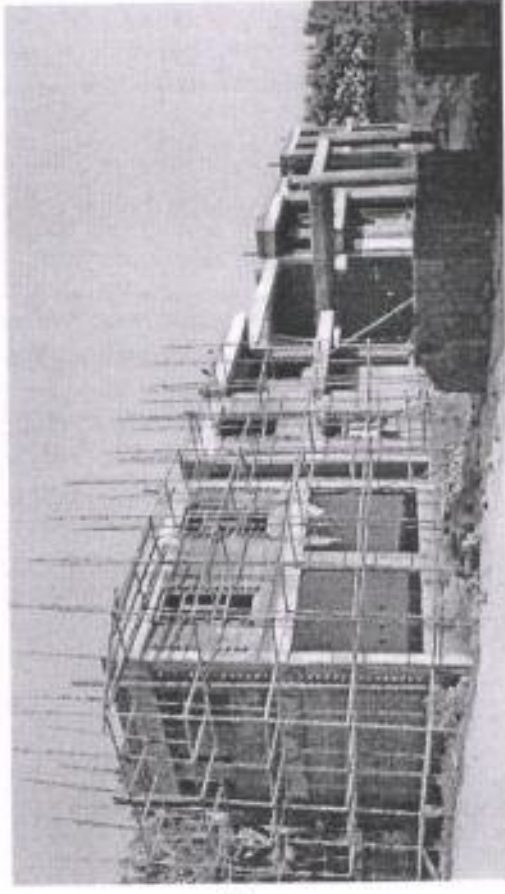

श्रेणी-5 आवास दिनांक 15.09.2018

